



Programme immobilier Lycée





Travaux réalisés ou en cours de réalisation



ADAP INTERNAT SAINT MICHEL




Escaliers

Contraste nez-de marche et prolongement des mains courante



AVANT

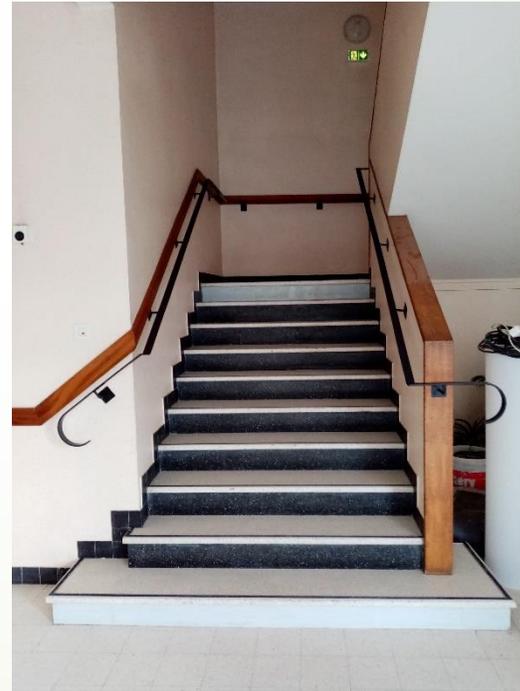

APRES



Réfection des sanitaires rez-de chaussée




AVANT

APRES


Eclairage des couloirs




AVANT

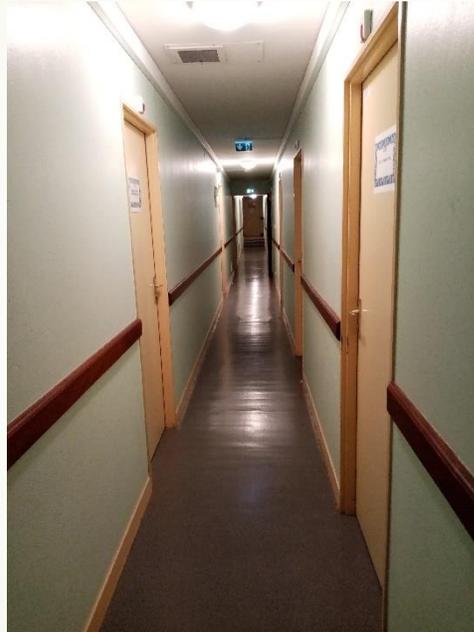

APRES

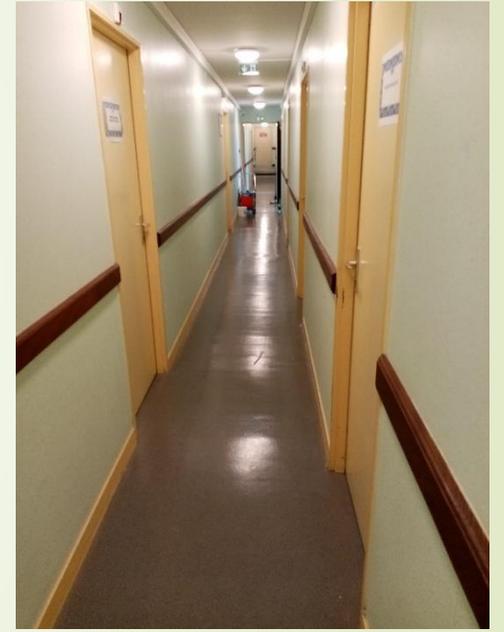

Deux chambres PMR

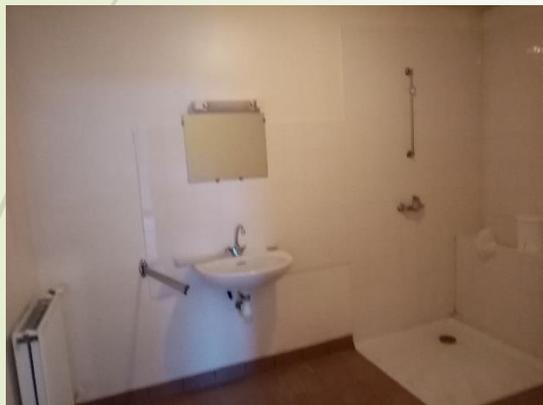

AVANT



EN COURS

MODIFICATION ET REMPLACEMENT DES OUVERTURES (réalisation prévue en janvier 2022)



Entrée internat



Chambre PMR



Local entretien



SALLE 4



SALLE 2




CUISINE

LYCEE



Réfection du sol du CDR

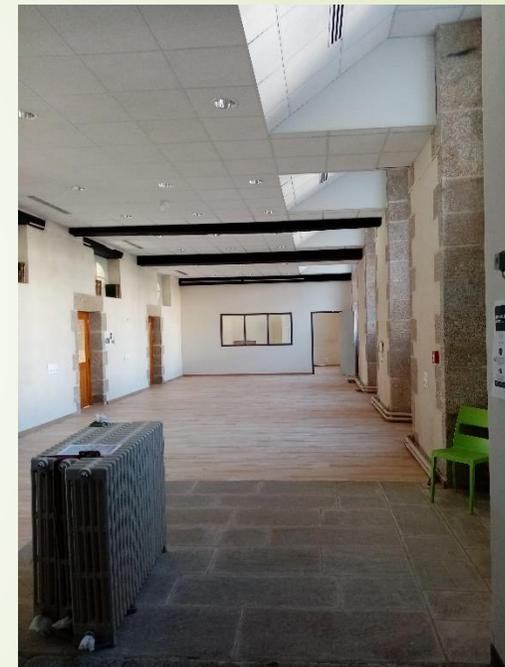

Salle multimédia



AVANT



APRES

Peinture couloir salle multimédia




Sanitaires internat



AVANT



EN COURS

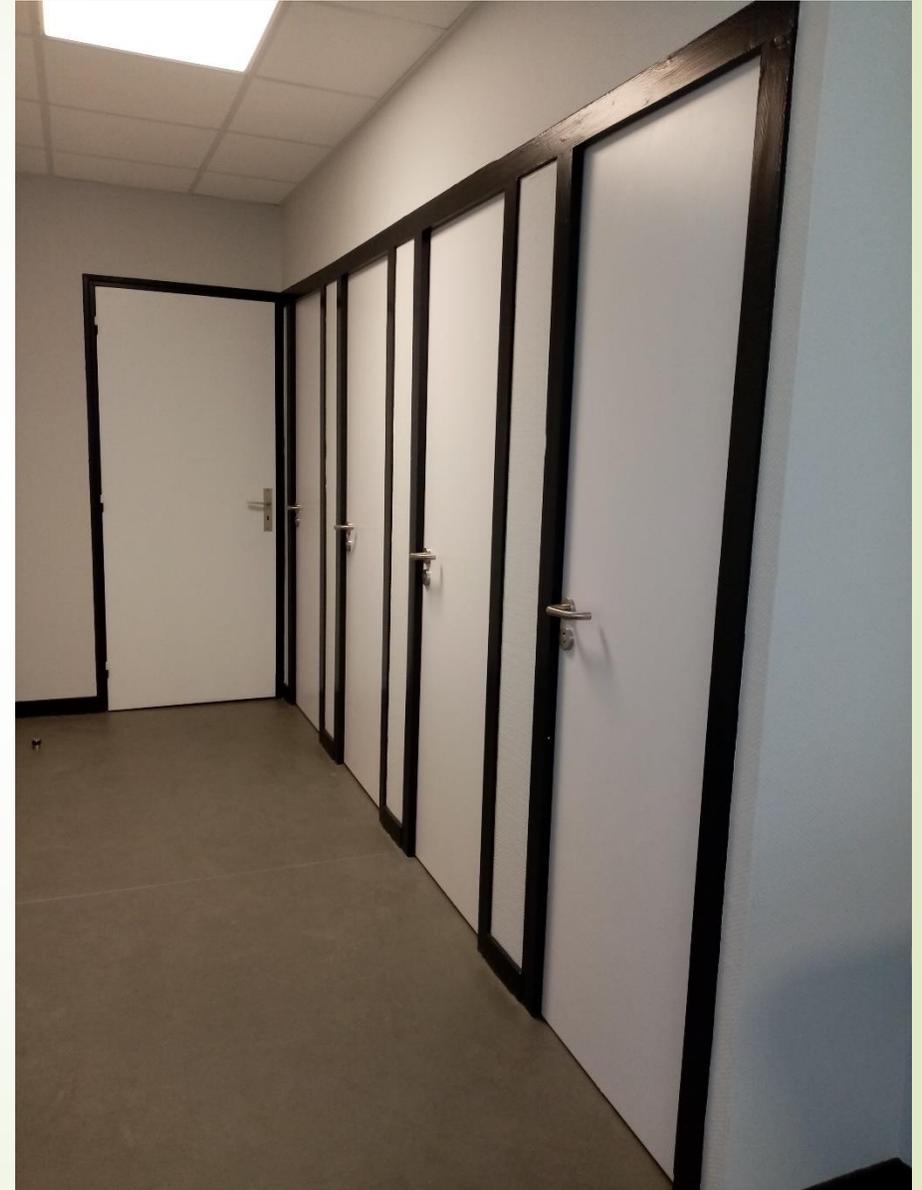


Bâtiment G



AVANT



APRES

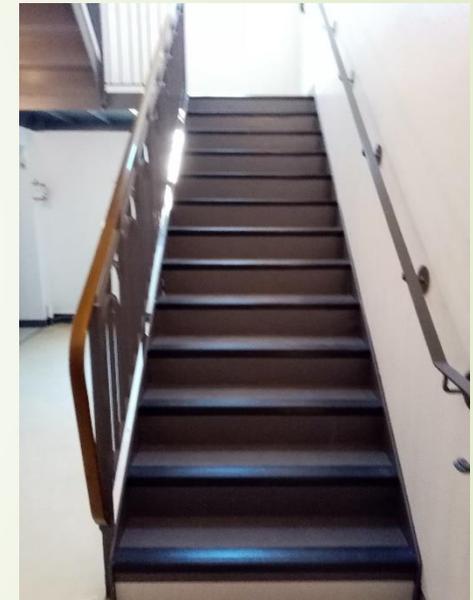

Réhabilitation des sanitaires extérieurs



Divers

Bâtiment H


Démontage de 3 estrades en salles HO11, HO13, HO15, H115
Modification tableaux et vidéoprojecteurs aux normes PMR
ADAP

G210

Création d'un meuble de rangement pour les nouveaux ordinateurs portables



PROJETS



ANNEE	TRAVAUX	MONTANT TTC
2021	CDR : réfection du sol	51 484,07 €
2021	Aménagement salle informatique F100	25 984,87 €
2021	ADAP	422 507,74 €
2021	Bâtiment G : peinture cage d'escalier	4 808,16 €
2021-2022	REMPARTS	415 008,29 €
2021-2022	SANITAIRES EXTERIEURS COUR CHAPELLE : rénovation	406 134,54 €
2022	Préau à vélos	7 500,00 €
2022-2023	BATIMENT G : Ravalement façade Ouest et sud et escalier de secours Phase 1	361 297,20 €
2022-2023	Bâtiment G : Ravalement façade Nord et Est	165 885,00 €
2022-2023	Bâtiment G : Rénovation salle d'étude	268 585,00 €
2023-2024	Internat Saint-Michel VMC, menuiseries, salle d'études	59 550,00 €
2023-2024	Internat Saint-Michel : Ravalement façade Nord (côté rue Saint Michel)	193 194,00 €
2022-2023	POLE SCIENCES et REHABILITATION BATIMENT H Phase 1 : Etudes et honoraires	300 000,00 €
2023	Internat filles lycée : aménagement salle détente	12 526,33 €
	TOTAL	2 694 465,20 €
